

ČASŤ 1
ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: 268/5120/2025

evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2025/004/15

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa,
I/62 Sered', most ev. č. 62-013 – stavebné práce**

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1. Objednávateľ

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

e-mail:

Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

000 033 28

2021067785

Štátna pokladnica

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Dana Micháľková, riaditeľka SSC IVSC Bratislava
- vo veciach technických: Ing. Angelika Agócsová, PhD., Úsek investičnej prípravy SSC IVSC Bratislava
- vo veciach realizačných: Ing. Peter Matúšek, Úsek investičnej výstavby SSC IVSC Bratislava
- kontroly kvality materiálov a prác: Mgr. Ivana Šimková, PhD., OL SSC IVSC Bratislava

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M 95 zo dňa 07.12.1995

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený v zmysle Podpisového poriadku: Ing. Martin Valko, člen predstavenstva

Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava
- vo veciach technických: Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava
- vo veciach realizačných: Ing. Pavol Batorek

Právna forma:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania
(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list (Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia ponúk, časť 1.5 Prílohy a formuláre, Zväzok 1 súťažných podkladov tak, ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)
 - (c) Príloha k ponuke
(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (d) Osobitné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (e) Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (f) Technické špecifikácie
(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (h) Cenová časť
(Zväzok 4 súťažných podkladov)
 - (i) Ponuka Zhotoviteľa
(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (j) Vzorové tlačivá
(Zväzok 2 Časť 4¹ až 9 súťažných podkladov)
 - (k) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené v Profile verejného obstarávateľa-Objednávateľa, v Zákazke, časti Dokumenty. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo **Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa, I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 – stavebné práce** a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.

¹ Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby.

2

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.
2. Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní.
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

8.	Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH.....	6 454 053,85 EUR
	DPH 23%	1 484 432,38 EUR
	Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH.....	7 938 486,23 EUR

(slovom sedemmiliónov deväťstotridsaťosemtisíc štyristoosemdesiatšesť 23/100 EUR s DPH)

9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumie všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.
10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na predmet zákazky **Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa, I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 – stavebné práce („kľúčoví a nekľúčoví odborníci na stavbe“)**. Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá Objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy:
Zmluva nadobudne účinnosť šesťdesiaty kalendárny deň potom, ako bude Zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie Objednávateľa (SSC) o tom, že Objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy.
Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadieť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 2 Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov na stavbe
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa
 - časť 3.1 Vecný harmonogram
 - časť 3.2 Míľniky – nebudú určené, kdekoľvek v texte v obchodných podmienkach sa nachádzajú odkazy na míľniky, tieto uchádzač/Zhotoviteľ nemá brať do úvahy

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

- Príloha č. 4 Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
 17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.
 18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
 - a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie.
 - h) Úrad pre verejné obstarávanie
 20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa.....

V, dňa

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Martin Valko
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

.....
Mgr. Norbert Polievka, MA
generálny riaditeľ
Slovenská správa ciest

.....
Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva
Dorpastav, a.s.

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

- A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok
 B/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)
 C/ Dodávateľa Zhotoviteľa

A/

p.č.	Priami Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. Račianska 162 831 54 Bratislava IČO : 31 322 999 Slovensko		Dočasné trakčné vedenie, preložka kamerového systému, preložka miestneho rozhlasu, preložka verejného osvetlenia	6,96%	552 518,64
			Súhrn podielu subdodávok	6,96%	552 518,64

B/

p.č.	Podzhotovitelia (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov) (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	Zyry – Tem, s.r.o. Lieskovská cesta 4121 960 01 Zvolen IČO : 35 911 727 Slovensko		Ochrana káblov Slovak Telekom	0,04%	3 175,39
2.	Stavokov, spol. s.r.o. Brnianska 12/2934 911 01 Trenčín IČO : 34 108 777 Slovensko		Mostné ložiská, mostné závery	0,79%	62 714,04
3.	TERRAcontrol s.r.o. Drieňová 27 821 01 Bratislava IČO : 51 201 097 Slovensko		Geodetické práce	0,8%	63 507,89
4.	Mizi s.r.o. Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520 Slovensko		Dopravné značenie	0,98%	77 797,17

	Súhrn podielu subdodávok	2,61%	207 194,49
--	---------------------------------	--------------	-------------------

C/

p.č.	Dodávateľa Zhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
			Súhrn podielu subdodávok		

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Martin Valko
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových a neklúčových odborníkov na stavbe

Funkcia	Meno a priezvisko
Vedúci stavby	Ing. Peter Ďuriš
Zástupca vedúceho stavby	Ing. Michal Šamaj
BOZP	Ing. Ivan Pucher
Zodpovedný geodet	Ing. Richard Szabó

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Martin Valko
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva

Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniám - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

- Vecný harmonogram a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

časť 3.1 Vecný harmonogram


- tzv. Ganttov graf- grafická časť vypracovaná vo formáte *.pdf s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie.

časť 3.2 Míľniky

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

- vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).

Časový plán

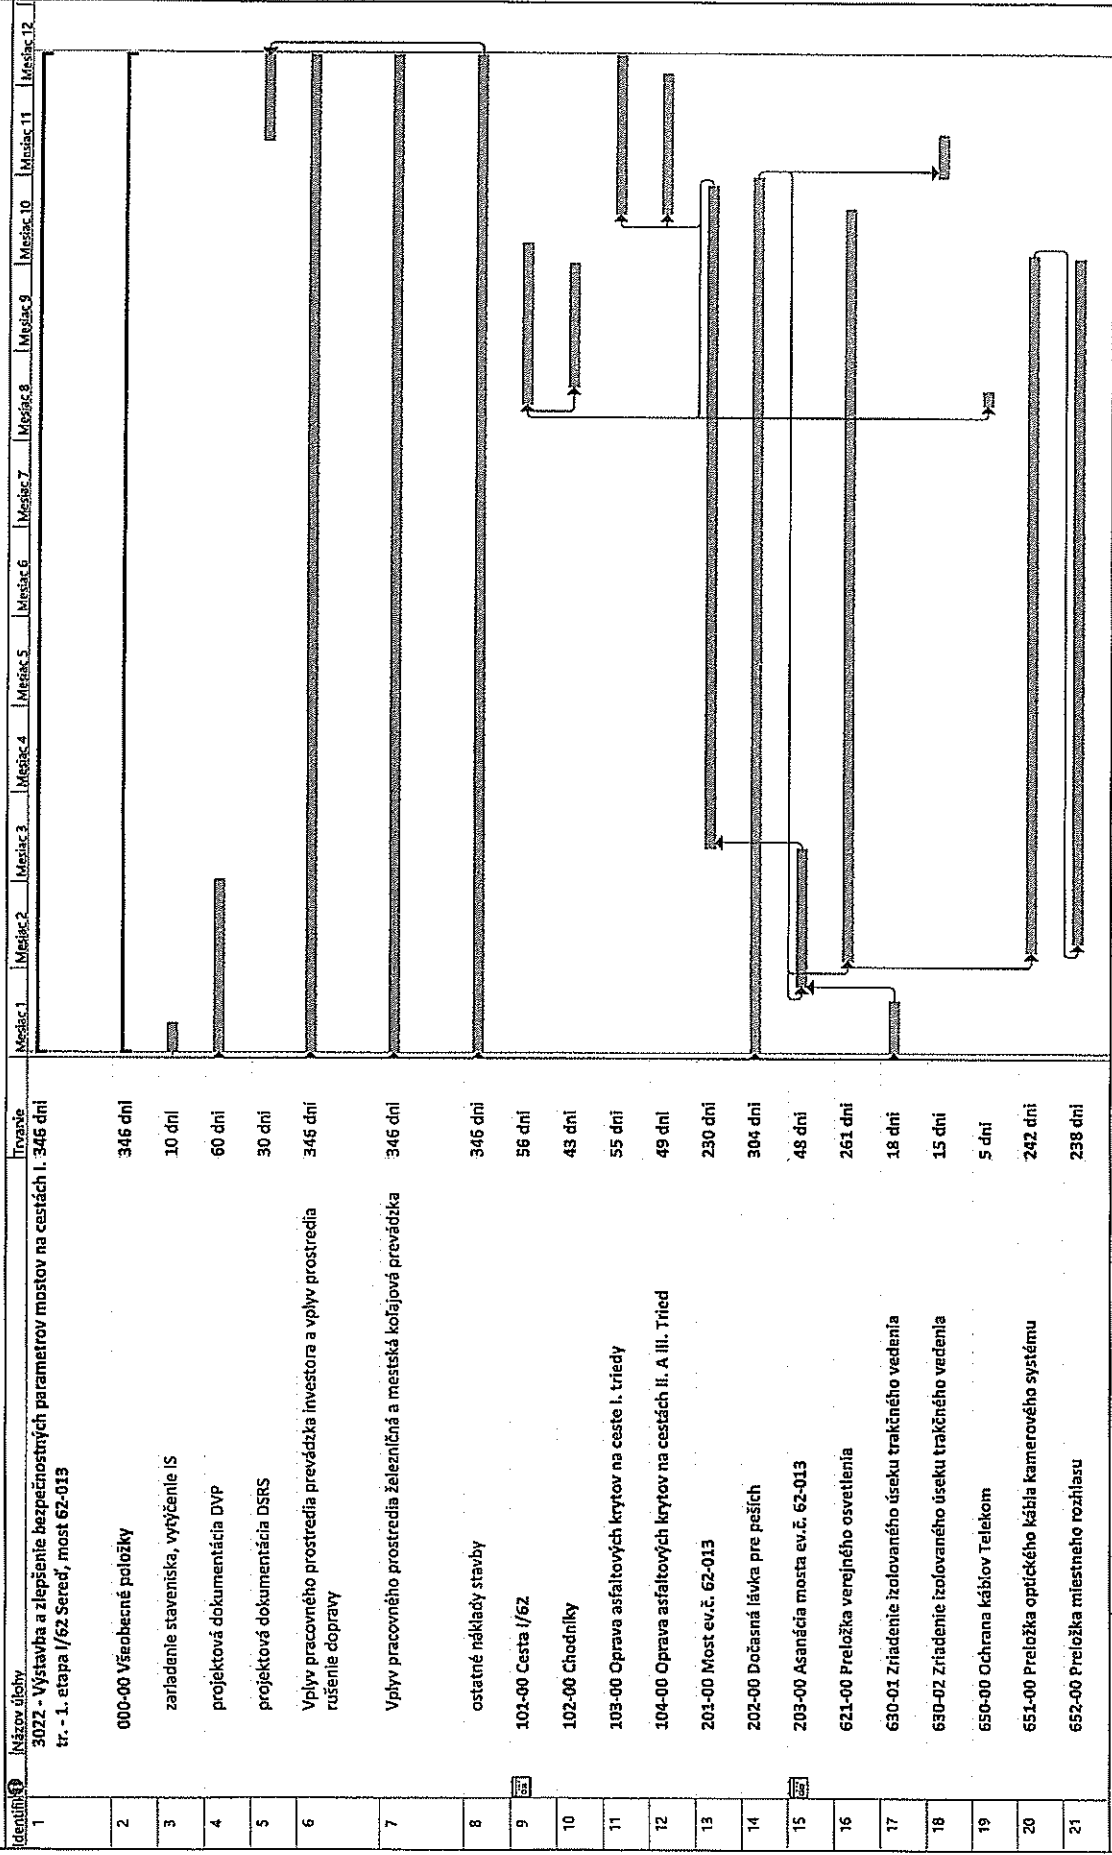

Identifikačný	Názov úlohy	Trvanie	Manuálny úloha	Manuálny súhrn	Manuálny súhrn	Manuálny súhrn	Manuálny súhrn	Termin	Manuálny priebeh
1	3022 - Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. 346 dní tr. - 1. etapa I/62 Sereď, most 62-013								
2	000-00 Všeobecné položky	346 dní							
3	zariadenie staveniska, vytyčenie IS	10 dní							
4	projektová dokumentácia DVP	60 dní							
5	projektová dokumentácia DSRs	30 dní							
6	Vplyv pracovného prostredia prevádzka investora a vplyv prostredia rusenie dopravy	346 dní							
7	Vplyv pracovného prostredia železničná a mestská koľajová prevádzka	346 dní							
8	ostatné náklady stavby	346 dní							
9	101-00 Cesta I/62	56 dní							
10	102-00 Chodníky	48 dní							
11	103-00 Oprava asfaltových krytov na ceste I. triedy	55 dní							
12	104-00 Oprava asfaltových krytov na cestách II. A III. triedy	49 dní							
13	201-00 Most ev.č. 62-013	230 dní							
14	202-00 Dočasná lávka pre peších	304 dní							
15	203-00 Asanácia mosta ev.č. 62-013	48 dní							
16	621-00 Preložka verejného osvetlenia	261 dní							
17	630-01 Zriadenie izolovaného úseku trakčného vedenia	18 dní							
18	630-02 Zriadenie izolovaného úseku trakčného vedenia	13 dní							
19	650-00 Ochrana káblov Telekom	5 dní							
20	651-00 Preložka optického kábla kamerového systému	242 dní							
21	652-00 Preložka miestneho rozhlasu	238 dní							

Dátum: Štr 8.1.25


FAKTURAČNÝ HARMONOGRAM - KUMULATÍVNA KRIVKA NÁKLADOV


Stavba : Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1.etapa "I/62 Sered", most ev.č. 62-013
 Vec: Fakturačný harmonogram - kumulatívna krivka nákladov

SO	Číslo stavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000-00	Všeobecné položky	100 810,83 €	240 585,87 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €	31 552,83 €
101-00	Cesta I/62	219 959,73 €											
102-00	Chodník	197 806,28 €											
10500	Oprava asfaltových krytov na ceste I triedy	1 737 970,95 €											
106-00	Oprava asfaltových krytov na cestách II. a III. triedy	1 081 880,02 €											
201-00	Most ev.č. 62-013	1 742 029,59 €											
202-00	Dočasné bliká prie pŕiľach	184 934,37 €											
203-00	Asanácia mosta ev.č. 62-013	253 653,89 €											
203-00-01	Krátkodobé bezpečnostné opatrenia - odsťahovanie	2 894,09 €											
62-00	Priečžka verejného osvetľenia	64 285,84 €											
63-00	Zhadenia občasného izozvavného ŕezku trakčného vedenia	251 827,78 €											
63-00	Demonážé dočasného izozvavného ŕezku trakčného vedenia	116 549,15 €											
65-00	Ochrana káblov Slovens Telekom	2 797,22 €											
65-00	Priečžka optického kábla kamerového systému	9 451,15 €											
65-00	Priečžka miestneho rozhlasu	8 150,79 €											
	Mesačný plán	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €	4 124 634,34 €
	Kumulatívna krivka plán	4 124 634,34 €	8 249 268,68 €	12 373 903,02 €	16 508 537,36 €	20 643 171,70 €	24 777 806,04 €	28 912 440,38 €	33 047 074,72 €	37 181 709,06 €	41 316 343,40 €	45 450 977,74 €	49 585 612,08 €

FAKTURAČNÝ HARMONOGRAM - KUMULATÍVNA KRIVKA NÁKLADOV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-433 215,24 €	828 844,00 €	1084 199,72 €	1 411 306,44 €	1 557 330,00 €	1 704 552,74 €	1 797 688,04 €	2 602 231,20 €	2 898 848,63 €	4 102 161,43 €	5 308 590,13 €	6 454 053,25 €
6,71%	17,84%	15,20%	21,67%	24,16%	30,41%	30,91%	40,20%	54,83%	63,50%	81,65%	100,00%

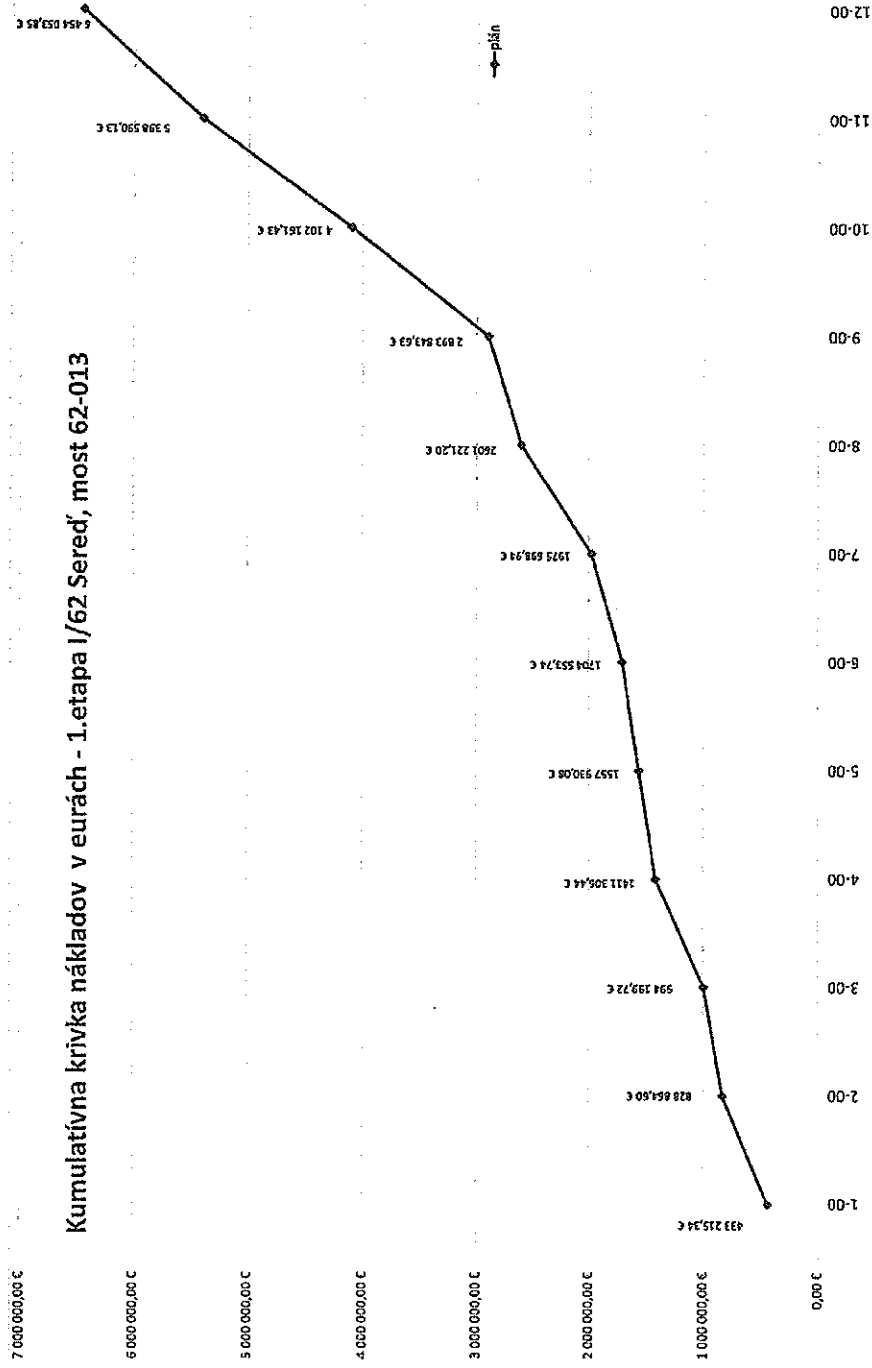

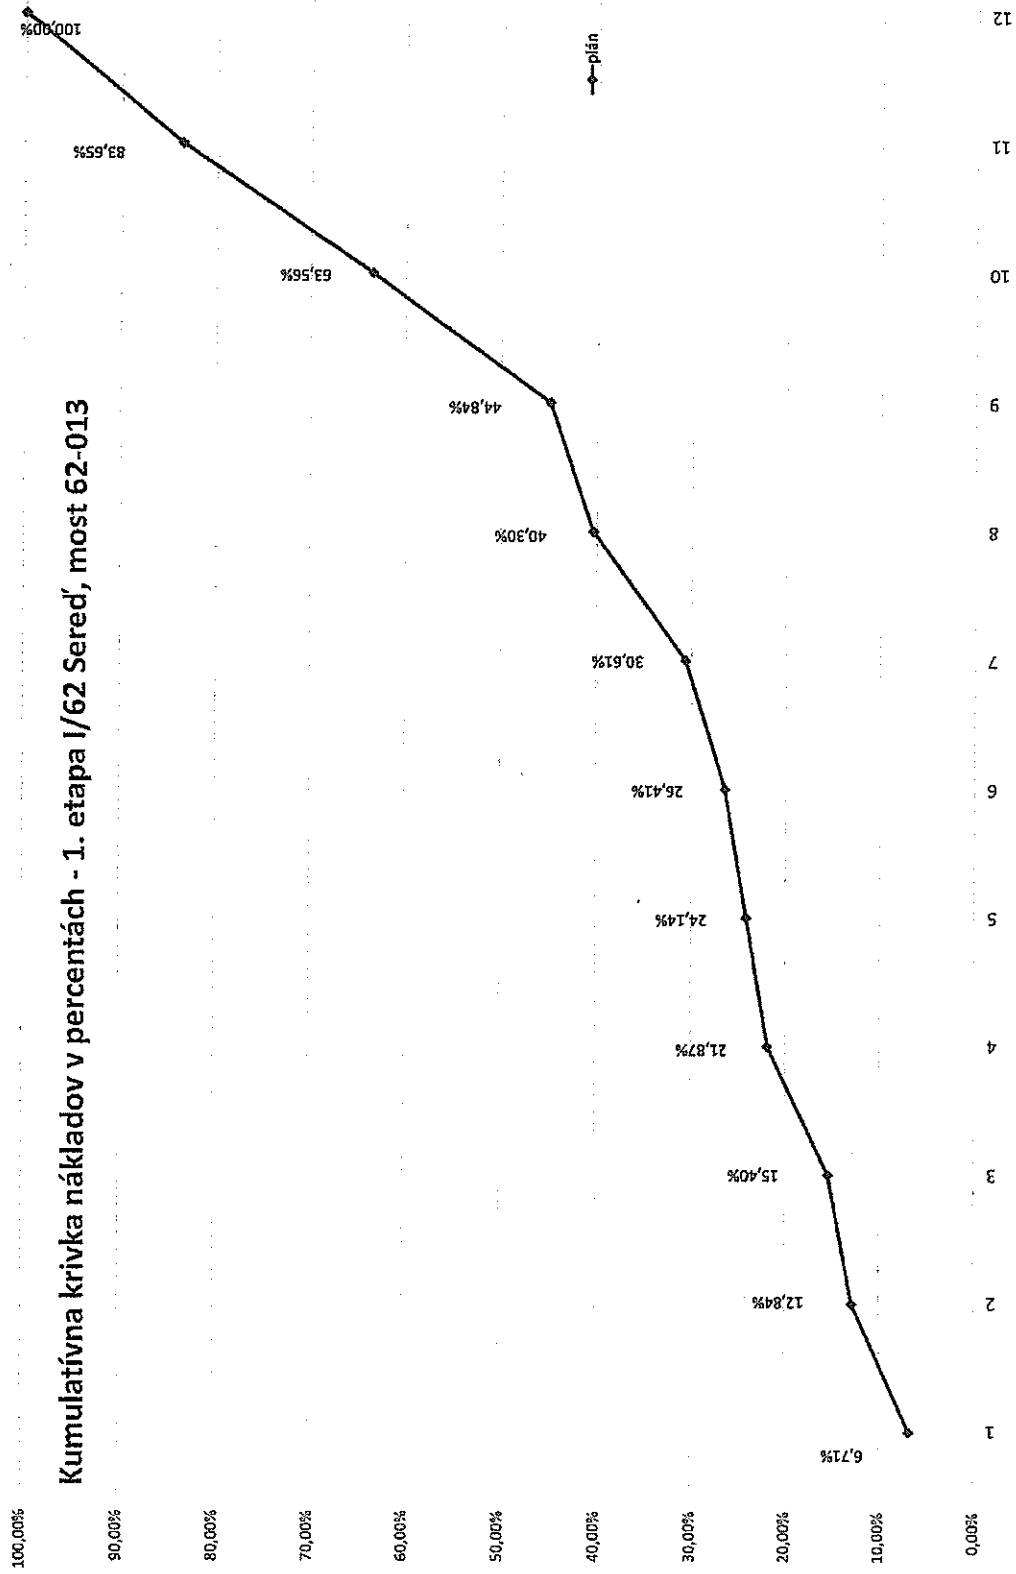

Príloha č. 4 k Zmluvným dojednaniám - Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Priamych Podzhotoviteľov, Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len "subdodávateľia"):
 - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
 - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2 Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o Díelo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o Díelo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednú za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o Díelo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o Díelo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľa)

1. Stavebník je povinný :

- a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
- b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o Dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o Dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľa – Úsek investičnej výstavby IVSC Bratislava

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátni práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi)

1. NAPOMENUTIE (porušenie povinnosti zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítika
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarnych zariadení a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinností opakovane (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 30,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakovane
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien

- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinností opakované (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcu
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, vizač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa, I/62 Sered', most ev. č. 62-013 – stavebné práce

Uchádzač / skupina dodávateľov

DOPRASTAV, A.S.
DRIEŇOVÁ 27
826 56 BRATISLAVA

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

ÁNO

NIE

Kritérium	Návrh na plnenie kritéria	
Kritérium č. 1 Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	cena celkom v EUR bez DPH	6 454 053,85
	DPH 23%	1 484 432,28
	cena celkom v EUR s DPH	7 938 486,23
Kritérium č. 2 Lehota výstavby vyjadrená v celých dňoch odo dňa začatia prác	počet dní	346

V Bratislave,

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe splnomocnenia)

¹ Nehodiace sa preškrtnúť

Císlo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
000-00	2111	000-00 Všeobecné položky	590 193,00	135 744,39	725 937,39
101-00	2111	101-00 Cesta I/62	219 999,73	50 590,74	270 590,47
102-00	2111	102-00 Chodník	197 806,28	45 495,44	243 301,72
103-00	2112	103-00 Oprava asfaltových krytov na ceste I. triedy	1 737 970,95	399 733,32	2 137 704,27
104-00	2112	104-00 Oprava asfaltových krytov na cestách II. a III. triedy	1 061 980,02	244 255,40	1 306 235,42
201-00	2141	201-00 Most ev. č. 62-013	1 742 029,59	400 666,80	2 142 696,39
202-00	2141	202-00 Dočasná lávka pre peších	194 394,37	44 710,71	239 105,08
203-00	2141	203-00 Asanácia mosta ev. č. 62-013	253 663,89	58 342,70	312 006,59
203-00-01	2141	203-00-01 Krátkodobé dočasné bezpečnostné opatrenia - odstránenie	2 984,08	686,34	3 670,42
621-00	2224	621-00 Preložka verejného osvetlenia	64 285,84	14 785,74	79 071,59
630-01	2122	630-01 Zriadenie dočasného izolovaného úseku trakčného vedenia	251 927,78	57 943,39	309 871,17
630-02	2122	630-02 Demontáž dočasného izolovaného úseku trakčného vedenia	116 549,15	26 806,30	143 355,45
650-00	2224	650-00 Ochrana káblov Slovak Telekom	2 797,22	643,36	3 440,58
651-00	2224	651-00 Preložka optického kábla kamerového systému	9 361,15	2 153,06	11 514,21
652-00	2224	652-00 Preložka miestneho rozhlasu	8 150,79	1 874,68	10 025,47
Celkový súčet			6 454 053,85	1 484 432,38	7 938 486,23
